

## Ondersteuning monitoring doelrealisatie

### Aanleiding en doel

Brabantse Delta wil de monitoring van de realisatie van beleidsdoelen richten op de zes doelen die in het bestuursprogramma worden genoemd. Het gaat om de volgende doelen: hydrologisch herstel natte natuurepaleis, aanleg regionale waterberging, realisatie beek- en kreekherstel, aanleg vispassages, inrichting viswateren en aanleg ecologische verbindingzones.

Verdeeld over 20 projectgebieden en een veelvoud aan projecten voert Brabantse Delta diverse activiteiten uit die bijdragen aan het realiseren van bovengenoemde doelen. Aanleiding voor dit project was dat het waterschap wil evalueren in hoeverre en met welk tempo deze activiteiten bijdragen aan de doelen en of de doelen hiermee op tijd worden gehaald. Doel van dit project was om de huidige stand van zaken vast te stellen en om een visie op te stellen op de toekomstige aanpak van de monitoring van doelrealisatie.

### Aanpak

In het project is een inventarisatie van de huidige stand van zaken rond de monitoring van doelrealisatie verricht. In individuele interactieve sessies is met projectleiders de voortgang van projecten besproken en zijn projectlocaties zo precies mogelijk op kaart ingetekend. Met behulp van GIS is uit de kaartbeelden informatie gegenereerd over het aantal geplande en gerealiseerde eenheden (km, ha, stuks) aan maatregelen. Vervolgens is een vergelijking gemaakt met de gegevens in het projectenadministratiesysteem Lansa. Hieruit is een actueel beeld van de voortgang van doelen naar voren gekomen en is geëvalueerd waar nog discrepanties en lacunes liggen. Tevens is op basis van de huidige praktijk en interviews met key-persons een visie geschetst op de toekomstige aanpak van de beleidsmonitoring.

### Resultaat

De voortgang van de doelrealisatie van de zes genoemde doelen is bepaald en gepresenteerd in diagrammen. Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen de voortgang volgens het projecteninformatiesysteem en de voortgang volgens de kaartbeelden. Daarbij geconstateerde discrepanties en lacunes zijn benoemd. Tevens zijn de factoren besproken die kunnen leiden tot onder- of overschatting van de voortgang.

Er is een toekomstvisie opgeleverd waarin het huidige werkproces rond de monitoring van de doelrealisatie is beschreven en geschematiseerd. Vervolgens is geschetst hoe het werkproces richting de toekomst kan worden veranderd om het monitoren van de realisatie van beleidsdoelen nog effectiever te kunnen uitvoeren. Hiervan is ook een schematisatie opgesteld.

Tenslotte zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de monitoring en is een voorontwerp opgeleverd van een hiervoor te gebruiken analysetool.


### Projectgegevens

Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta  
Projectperiode: 2009-2010


### Meer informatie

Postbus 2177  
3800 CD Amersfoort  
Tel: 033 4753535  
www.hydrologic.nl

dirk-sytze.kootstra@hydrologic.nl

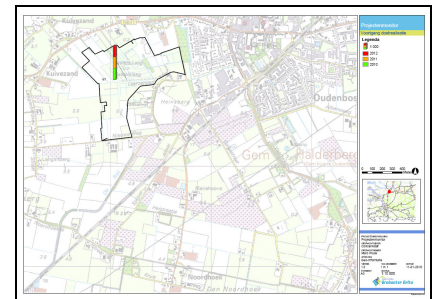

Projectbijdragen aan doelen in kaartbeelden weergegeven.

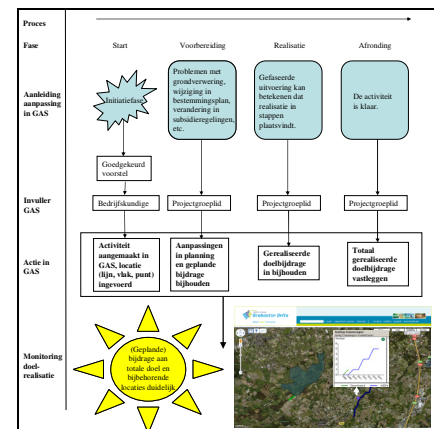

Geschematiseerde toekomstvisie op de aanpak van de beleidsmonitoring.
